



СНТ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

Отчёт по отсыпке дорог щебнем (3 этап).

08 Августа 2026 г.



Доставка щебня фр.20-40, 1 машина, 35 т. (Центральная дорога)





Доставка щебня фр.20-40, 2 машина, 35 т. (Центральная дорога)





Доставка щебня фр.20-40, 3 машина, 35 т. (Центральная дорога)





Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОСТРОЙ-Т»

ИНН 7017387567 КПП 701701001 634027, Россия, г. Томск, пр-т Мира, д.35, кв.61

Паспорт качества № 1777

«10» августа 2026 г.

На щебень фракции 20-40 ГОСТ 8267-93

1. Наименование потребителя: СНТ «ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ»
2. Количество 107,24 тонн
3. Дата отгрузки «07» августа 2026 г.
4. Карьер: «Омутнинский»

Испытания проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 8269.0-97.

Оценка результатов испытания ГОСТ 8267-93.

Результаты испытаний приведены в таблице

Показатели	Нормируемое значение ГОСТ 8267-93	Численные значения
Частные/полные остатки на ситах, мм		
50		0,4/0,4
40		9,2/9,6
20		86,1/95,7
Проход через сито 20 мм		4,3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 1,0	0,5
Содержание глины в комках в % от общего количества пылевидных и глинистых: для покрытий	Не более 0,25	0,0
Прочность, характеризуется маркой по дробимости при сжатии в цилиндре, по потере массы при испытании, %	Марка-потери 1200-9-11	Марка 1200 Потери 10,7
Содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм методом визуальной разборки, % по массе	Группа 2-10-15 Группа 3-15-25	24,3 3 группа
Наименьший диаметр, d=20 мм, полный остаток, %	% по массе - 90-100	95,7
Наибольший диаметр, D=40 мм, полный остаток, %	% по массе - 10	9,6
1,25 D=50 мм, полный остаток, % по массе	До 0,5	0,4
Марка по морозостойкости	По факту	F100
Насыпная плотность в абсолютно сухом состоянии, кг/м ³	По факту	1360

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.32112.ПР.01297 Срок действия с 11.09.2024 по 10.09.2027

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 70-31/20950-26 от 20.07.2026

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) № 000001767 от 23 июля 2026г.

Выдан на основании протокола испытаний № 008/26 от 08.02.2026, выданного Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» г. Томск, пл. Соляная, 2. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU. 32112.ПР.09, выдано 19.03.2024 СДС «СИБРЕГИОНСЕРТИФИКАЦИЯ»

Заместитель руководителя
отдела логистики ООО «АвтоСтрой-Т»
По доверенности № 07/25-ОЛ от 22.12.2025




/М.Ф.Альтергот /

М.П.



Центральная дорога уч.№7302 в направлении Тупика



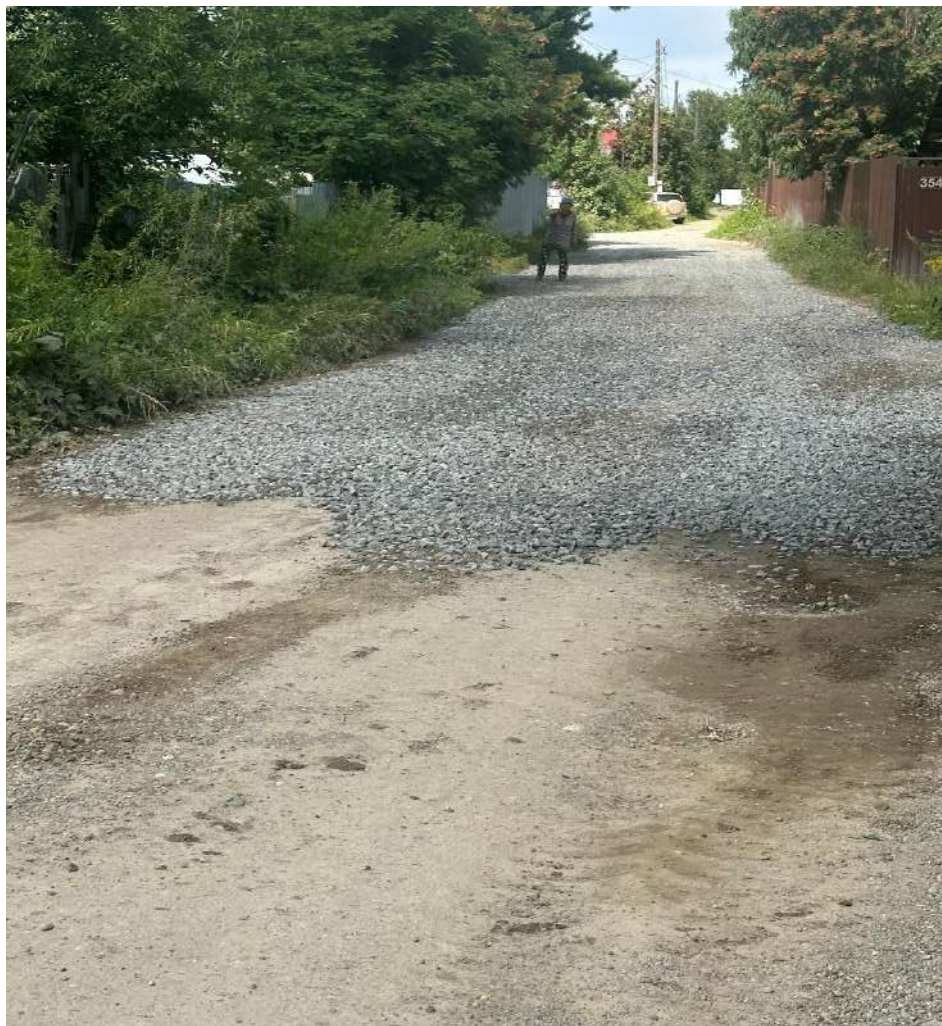




Участок №5307 в направлении уч.№5310 отсыпка щебнем фр.20-40





Участок №5310

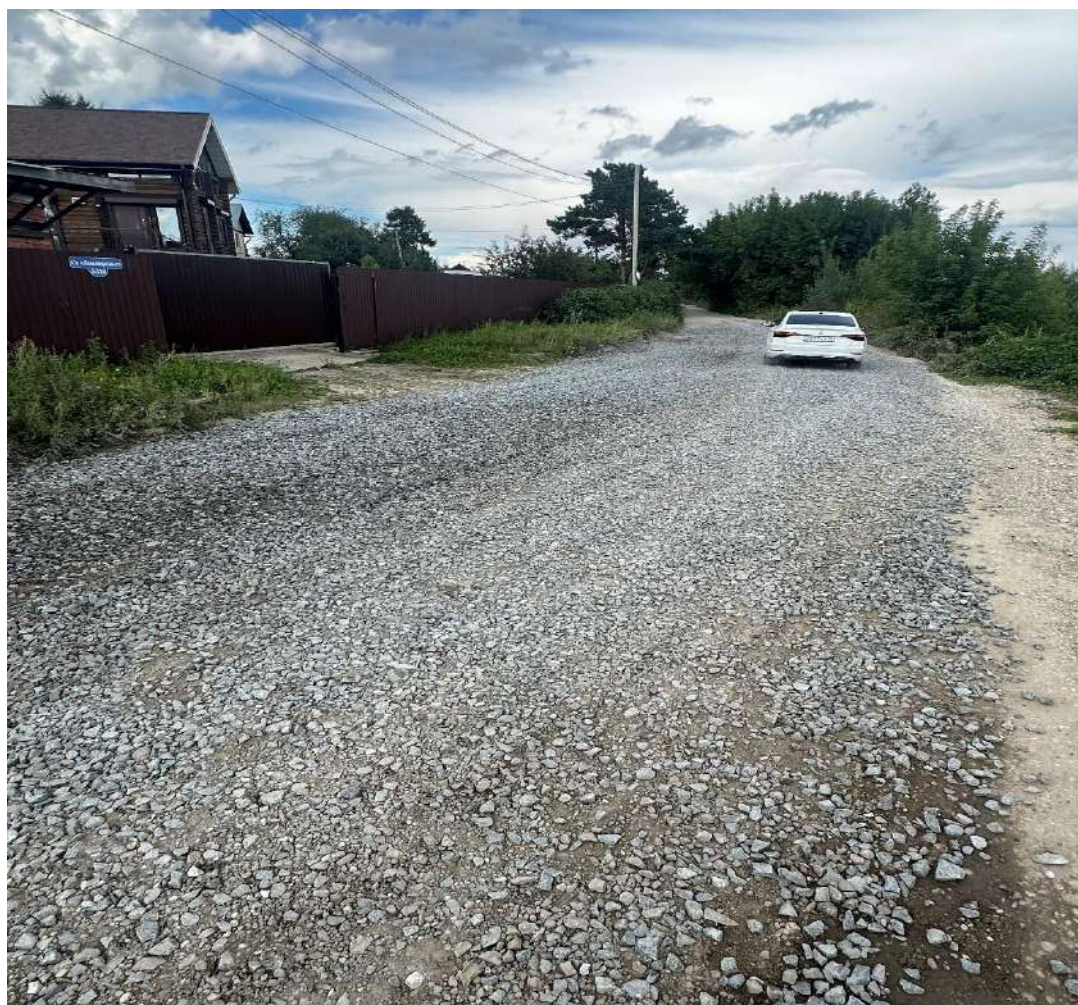



Участок №5312 в направлении уч.№5403





Участок №5313 в направлении уч.№5403





Участок №5605 отсыпка щебнем фр.20-40





Участок №5605 в направлении уч.№5802 отсыпка щебнем фр.20-40





Участок №5802 в направлении к уч.№5605





Отсыпка щебнем фр.20-40





Участок №5802 отсыпка щебнем фр.20-40





От уч.№5802 в направлении к уч.№5901





Грейдирование от уч.№6113 до уч.№5515





Данный отрезок дороги (уч.№6119) отсыпка щебнем **НЕВОЗМОЖНА**,
в связи с тем, что дорожное покрытие – асфальтное.





Участок №7205 в направлении уч.№7203 отсыпка щебнем фр.20-40





Участок №7203 отсыпка щебнем фр.20-40





Участок №6314 выполнено грейдирование дорожного покрытия





Участок №7401а выполнено грейдирование дорожного покрытия





Выполнено грейдирование дорожного покрытия





Выполнено грейдирование дорожного покрытия





Выполнена отсыпка щебнем фр.20-40 вблизи мусорной (контейнерной) площадки

